

# STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

ING. GIOVANNI GIUFFRIDA VIA PICARDI N° 16 - RAGUSA TEL. 0932/683118

## PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

**PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE BIDDEMI**

**LUNGO LA S.P. n°36 al Km 3,000**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**

**Oggetto:** Cronoprogramma (diagramma di Gantt)

**Scala:**

**Data:** 29/10/2012


**TAV.R13A**

**Il Tecnico:**

Dott. Ing. Giovanni Giuffrida

Per presa visione

**Il Committente:**

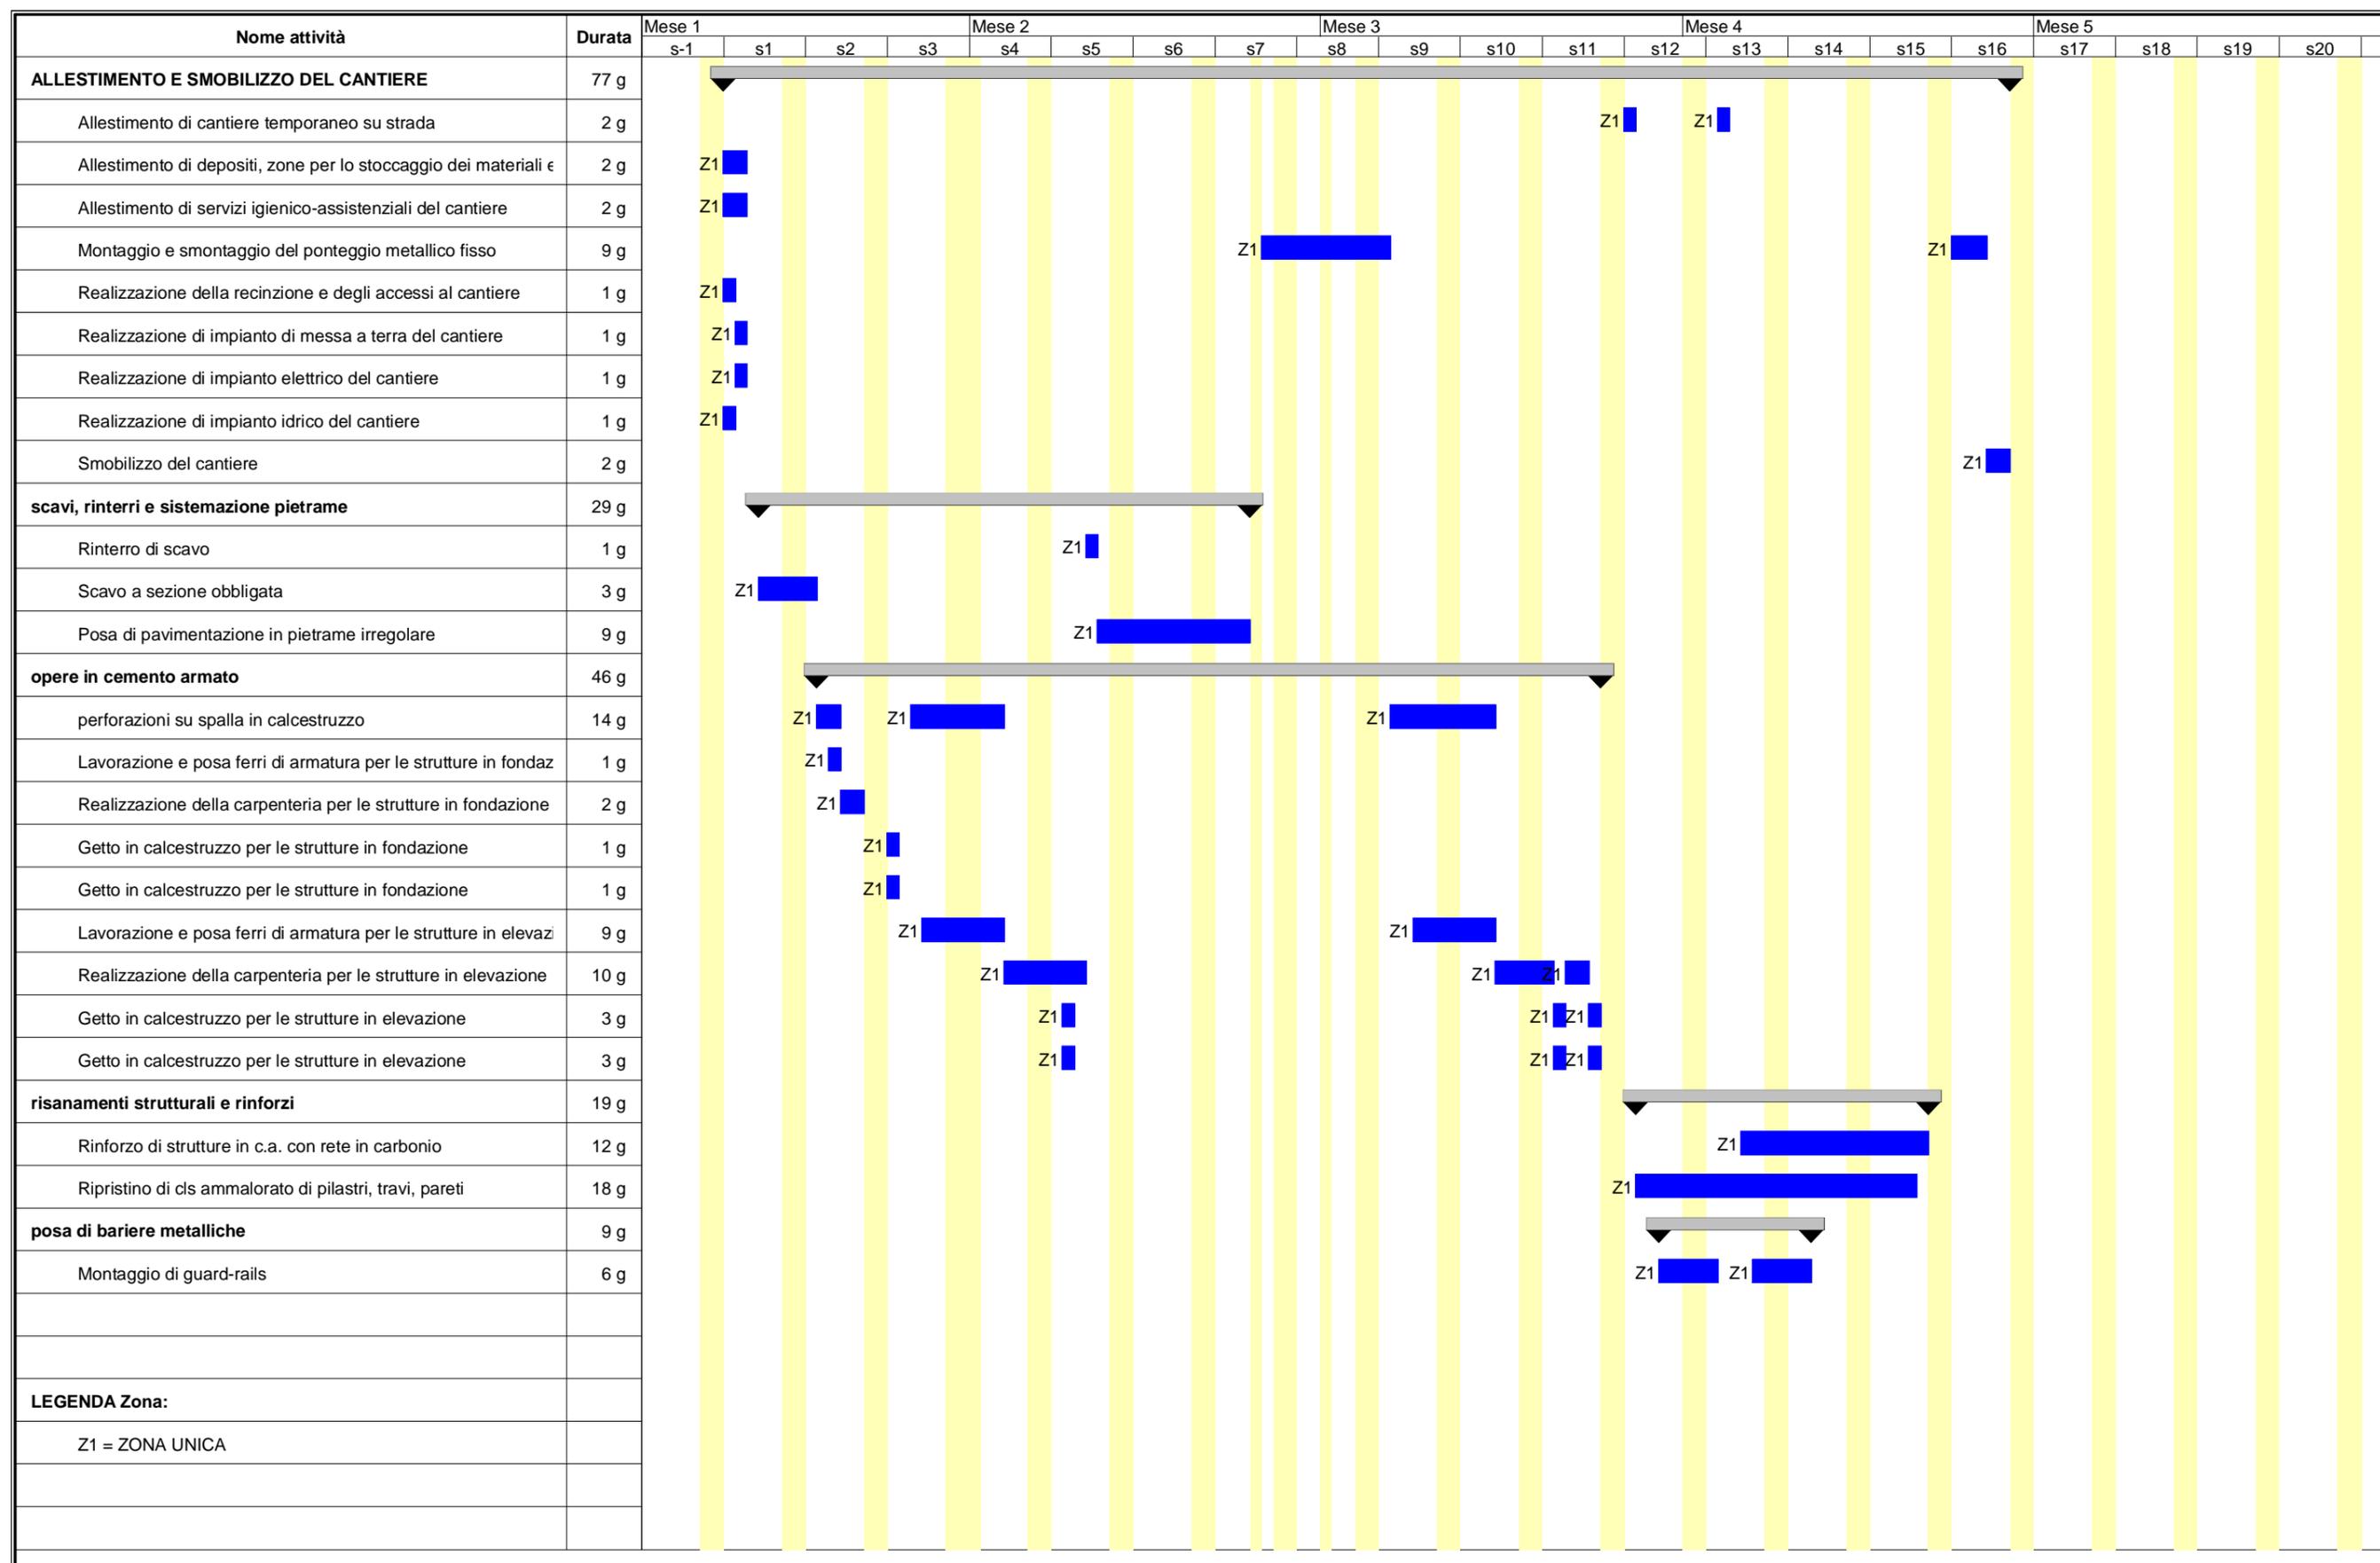

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	27/05/2013	27/05/2013
	1	1	1	1	04/06/2013	04/06/2013
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	11/03/2013	12/03/2013
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	11/03/2013	12/03/2013
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	2	6	11	26/04/2013	06/05/2013
	1	2	3	3	24/06/2013	26/06/2013
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	11/03/2013	11/03/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	12/03/2013	12/03/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	12/03/2013	12/03/2013
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	1	1	11/03/2013	11/03/2013
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	27/06/2013	28/06/2013
<b>scavi, rinterrati e sistemazione pietrame</b>						
Rinterro di scavo	1	1	1	1	11/04/2013	11/04/2013
Scavo a sezione obbligata	1	1	3	5	14/03/2013	18/03/2013
Posa di pavimentazione in pietrame irregolare	1	E	9	13	12/04/2013	24/04/2013
<b>opere in cemento armato</b>						
perforazioni su spalla in calcestruzzo	1	E	2	2	19/03/2013	20/03/2013
	1	E	5	8	27/03/2013	03/04/2013
	1	E	7	9	07/05/2013	15/05/2013
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	1	1	20/03/2013	20/03/2013
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	2	2	21/03/2013	22/03/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	25/03/2013	25/03/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	3	1	1	25/03/2013	25/03/2013
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	4	7	28/03/2013	03/04/2013
	1	1	5	7	09/05/2013	15/05/2013
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	5	7	04/04/2013	10/04/2013
	1	1	3	5	16/05/2013	20/05/2013
	1	1	2	2	22/05/2013	23/05/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	1	09/04/2013	09/04/2013
	1	1	1	1	21/05/2013	21/05/2013
	1	1	1	1	24/05/2013	24/05/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	1	09/04/2013	09/04/2013
	1	1	1	1	21/05/2013	21/05/2013
	1	1	1	1	24/05/2013	24/05/2013
<b>risanamenti strutturali e rinforzi</b>						
Rinforzo di strutture in c.a. con rete in carbonio	1	E	12	16	06/06/2013	21/06/2013
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	18	24	28/05/2013	20/06/2013
<b>posa di barriere metalliche</b>						
Montaggio di guard-rails	1	E	3	5	30/05/2013	03/06/2013

	1	E	3	5	07/06/2013	11/06/2013
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>1) = IMPRESA APPALTATRICE</p> <p>2) = IMPRESA MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO</p> <p>3) = FORNITURA CALCESTRUZZO</p> <p>E &lt;Nessuna impresa definita&gt;</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						
