RIEPILOGOfrev. 18/01/2018 - 28/09/2019 = 615 gg. Giorni lavorativi Frev:432 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
1.- OPERE STRUTTURALI SCUOLA	**1.893.359,44**	**18/01/2018**	**28/09/2019**	**615**
1.1.- Intervento Di Consolidamento	66.060,97	18/01/2018	24/02/2018	30
1.1.1.- 211.E41 Rimozione di	60,25	18/01/2018	18/01/2018	1
1.1.2.- NP120 Rimozione di gua	261,63	18/01/2018	18/01/2018	1
NP151 Rimozione dello zoccoletto esisten	77,04	18/01/2018	18/01/2018	1
1.1.4.- 231.L20 Puntellatur	461,02	19/01/2018	19/01/2018	1
1.2.- 111.D Scavo a sezione obbl	2.480,25	20/01/2018	23/01/2018	4
1.2.1.- 311.B Conglomerato	237,29	24/01/2018	25/01/2018	2
1.2.2.- 313.D Conglomerato	742,37	24/01/2018	25/01/2018	2
1.2.3.- 312.D Casseforme per	1.763,77	24/01/2018	25/01/2018	2
1.2.4.- 321.D Acciaio in ba	3.041,02	24/01/2018	25/01/2018	2
1.2.5.- 217.D Perforazione s	4.286,40	26/01/2018	31/01/2018	5
1.2.6.- NP80 Fornitura e posa	4.256,03	01/02/2018	02/02/2018	2
1.2.7.- 212.D Muratura ordin	3.133,72	02/02/2018	06/02/2018	5
1.2.8.- NP71 Taglio a sezione	2.430,76	07/02/2018	07/02/2018	1
1.2.9.- NP51 Taglio a sezione	995,17	07/02/2018	07/02/2018	1
1.2.10.- NP110 Realizzazione di	11.457,44	07/02/2018	10/02/2018	4
1.2.11.- NP180 Per il rinforzo	11.015,64	12/02/2018	15/02/2018	5
1.2.12.- 213.L22.D Sistema di	16.811,35	16/02/2018	22/02/2018	7
1.2.13.- 91.D Intonaco civi	1.013,02	23/02/2018	23/02/2018	1
1.2.14.- 91.K Strato di fini	686,99	23/02/2018	23/02/2018	1
1.2.15.- 121.U Fornitura e p	384,30	23/02/2018	23/02/2018	1
1.2.16.- 121.D Fornitura e p	615,53	23/02/2018	23/02/2018	1
1.2.17.- NP120 Ricalcazione	270,95	24/02/2018	24/02/2018	1
1.2.18.- 124.E21 Trasporto di	102,59	24/02/2018	24/02/2018	1
1.2.19.- 251.E61 Trasporto al	146,20	24/02/2018	24/02/2018	1
1.2.20.- 5.E1 Pavimento in pia	229,65	24/02/2018	24/02/2018	1
1.3.- Intervento Di Consolidamento	180.929,67	24/02/2018	17/08/2018	173
1.3.1.- 231.L41 Approntame	98.179,87	24/02/2018	03/11/2018	50
1.3.2.- 231.L131 Montovara p	12.415,57	20/03/2018	09/03/2018	14
1.3.3.- 231.L151 Schermatura	12.418,81	26/03/2018	15/03/2018	14
1.3.4.- NP261 Smontaggio accat	3.996,70	16/03/2018	19/03/2018	10
1.3.5.- 251.E81 Rimozione di	2.299,18	06/03/2018	02/03/2018	5
1.3.6.- 251.E91 Rimozione di	2.403,17	09/03/2018	05/03/2018	5
1.3.7.- NP151 Rimozione dello	5.741,44	12/03/2018	16/03/2018	14
1.3.8.- 251.E77 Rimozione di	1.635,13	19/03/2018	16/03/2018	3
1.3.9.- NP221 Smontaggio di ca	6.019,88	23/03/2018	14/03/2018	16
1.3.10.- NP231 Smontaggio di s	6.028,68	31/03/2018	22/03/2018	16
1.3.11.- 251.E61 Demolizione d	13.618,70	09/04/2018	05/01/2019	28
1.3.12.- 251.T1 Dismissione di	143,54	23/04/2018	06/01/2019	2
1.3.13.- 251.E41 Demolizione d	1.262,67	24/04/2018	07/01/2019	2
1.3.14.- 251.I1 Taglio a sezi	29.821,00	25/04/2018	05/01/2019	26
1.3.15.- 251.S1 Demolizione di	4.330,34	08/05/2018	23/01/2019	6
1.3.16.- 111.D Scavo a sezio	93.699,29	11/05/2018	08/02/2019	32
1.3.17.- 111.T1 Scavo a sezi	801,95	26/05/2018	08/02/2019	2
1.3.18.- 251.E1 Rimozione di	86.017,08	26/05/2018	06/03/2019	54
1.3.19.- 251.E61 Trasporto al	13.181,83	22/06/2018	19/03/2019	6
1.3.20.- 124.E21 Trasporto di	1.813,53	22/06/2018	27/03/2019	2
1.3.21.- NP13 Puliziia delle su	95.297,01	22/05/2018	24/03/2019	36
1.3.22.- 213.R61 Fornitura e c	67.295,55	29/06/2018	30/04/2019	74
1.3.23.- 213.R1 Rincocciatura	181.414,83	29/06/2018	30/04/2019	74
1.3.24.- NP221 Consolidamento	624.667,75	16/08/2018	16/06/2019	94
1.3.25.- 321.L1 Acciaio in b	4.124,29	02/08/2018	21/06/2019	10
1.3.26.- 321.D Casseforme per	2.366,55	02/08/2018	21/06/2019	10
1.3.27.- NP80 Fornitura e posa	4.276,85	02/08/2018	21/06/2019	10
1.3.28.- 721.D Fornitura e gl	147.521,84	07/08/2018	02/08/2019	84
1.3.29.- 721.E1 Montaggio in o	86.785,77	07/08/2018	02/08/2019	84
1.3.30.- 217.D Perforazione	47.867,40	07/08/2018	02/08/2019	84
1.3.31.- NP21 Per interpori in	564,34	07/08/2018	02/08/2019	84
1.3.32.- 212.D1 Muratura in	52.463,40	07/08/2018	02/08/2019	84
2.- OPERE EDILI DI RIFINITURA SCUOLA	**167.707,11**	**18/08/2018**	**13/10/2018**	**57**
2.1.- 15.A13.D1 Fornitura e colloc	4.824,08	18/09/2018	24/08/2019	4
2.2.- 231.L61 Smontaggio ad opera	41.444,25	20/09/2018	24/08/2019	48
2.3.- 22.E1.D Tramezzi con laterizi	2.767,78	18/08/2018	13/08/2019	2
2.4.- 22.E1.D1 Tramezzi con laterizi	557,18	18/08/2018	13/08/2019	2
2.5.- 31.K1 Fornitura e collocazi	1.127,26	18/08/2018	13/08/2019	2
2.6.- NP241 Montaggio telaio comple	7.511,38	18/08/2018	17/08/2019	10
2.7.- NP251 Montaggio di avvolgibil	6.762,91	22/08/2018	11/08/2019	10
2.8.- NP51 Fornitura, trasporto e p	1.588,13	27/08/2018	13/08/2019	4
2.9.- NP61 Rimontaggio di porte int	1.364,79	28/08/2018	13/08/2019	2
2.10.- 91.D1 Intonaco civile per i	4.469,97	28/08/2018	15/08/2019	6
2.11.- 5.91 Rivestimento di pareti	21.374,64	31/08/2018	01/08/2019	12
2.12.- 5.E1 Pavimento in piastrelle	21.452,31	04/09/2018	27/08/2019	12
2.13.- 5.191.I Fornitura e posa in	13.117,52	12/09/2018	30/08/2019	6
2.14.- 127.L21 Fornitura e posa i	23.983,76	15/09/2018	05/09/2019	12
2.15.- NP271 Smontaggio accostatune	13.533,80	21/09/2018	12/09/2019	14
2.16.- NP281 Smontaggio accostatune	643,83	28/09/2018	13/09/2019	2
2.17.- NP291 Smontaggio accostatune	13.047,75	28/09/2018	20/09/2019	16
2.18.- NP301 Smontaggio accostatune	1.892,47	06/10/2018	21/09/2019	2
2.19.- NP311 smontaggio accostatune	487,12	06/10/2018	21/09/2019	2
2.20.- NP41 Smontaggio, accostatune	392,64	06/10/2018	21/09/2019	2
2.21.- NP301 Demolizione e ricostru	446,12	07/10/2018	22/09/2019	3
2.22.- 6.L2.E1 Fondazione stradale	2.145,51	08/10/2018	28/09/2019	12
2.23.- 31.L1 Conglomerato cement	8.135,52	08/10/2018	28/09/2019	12
2.24.- 6.E2.E61 Pavimentazione con	4.148,80	08/10/2018	28/09/2019	12
MESE	------			

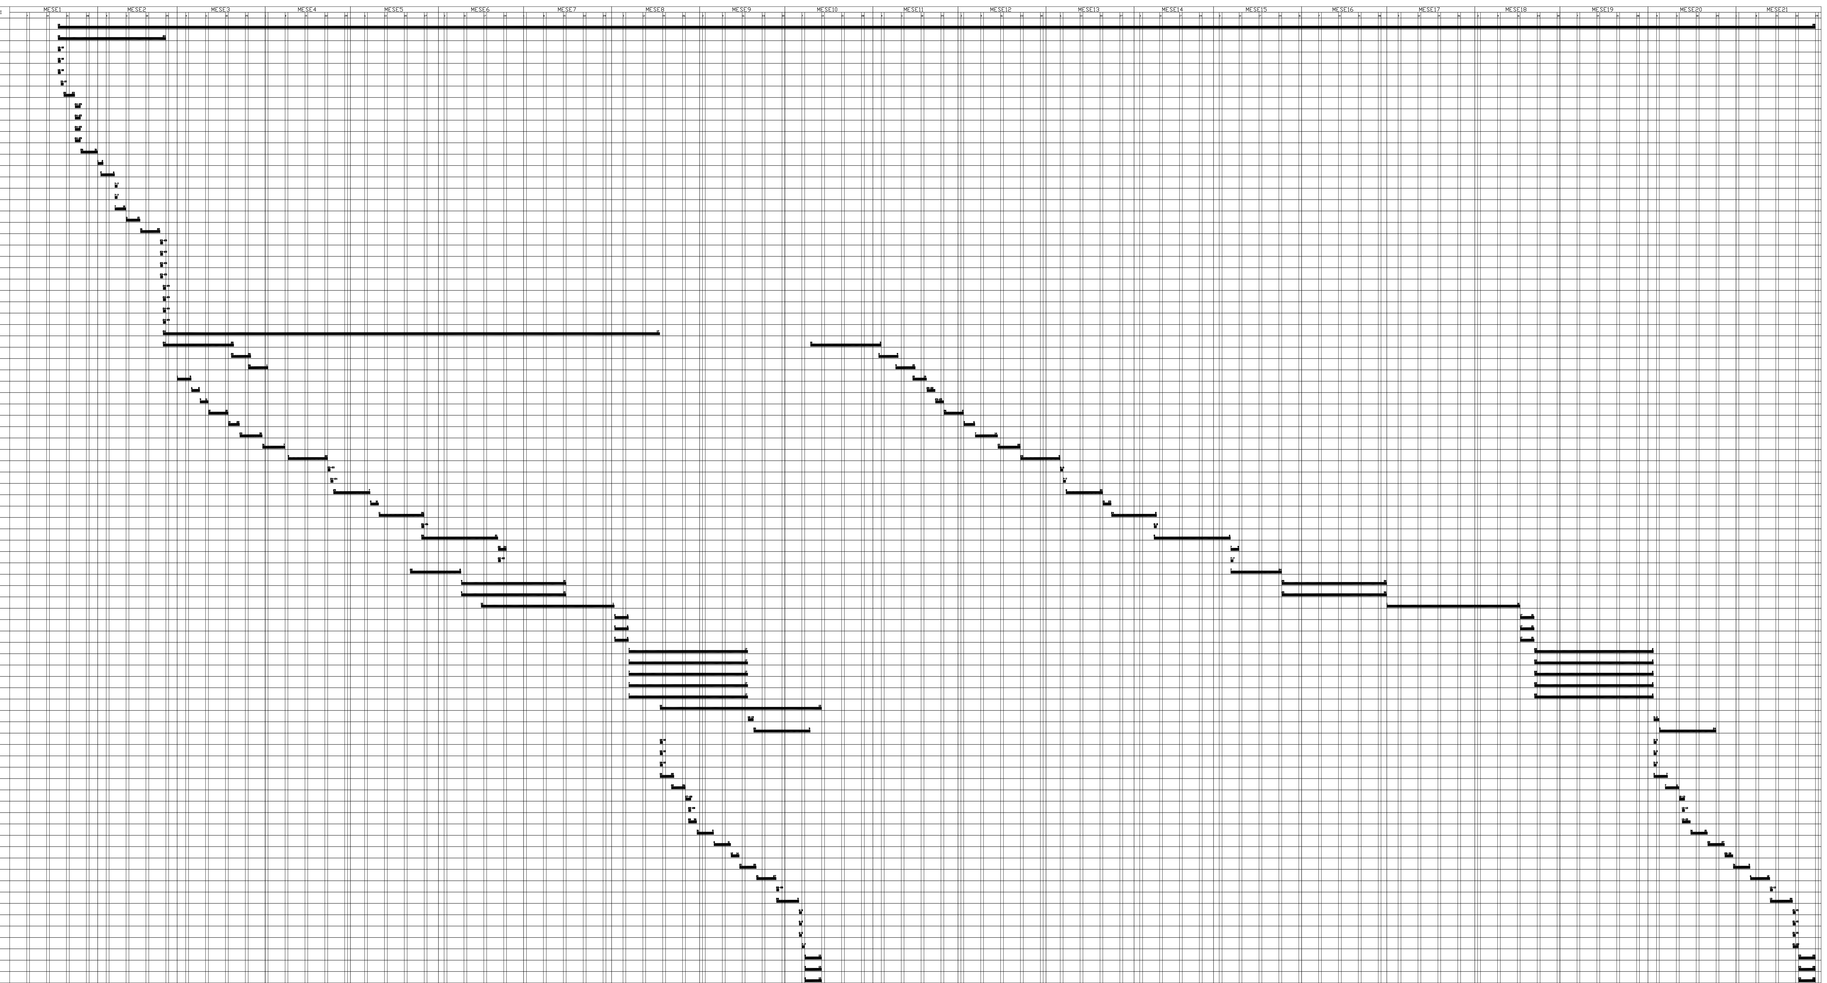

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

Settore IV Lavori Pubblici e Patrimonio

Istituto Professionale Statale per l'industria e l'artigianato di Vittoria

"ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA E PREVENZIONI INCENDI".

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Legge 27/12/2002, n.289, art.80 comma 21.
2° Programma stralcio a 6-programmazione triennale 1° programma stralcio

STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO

TAV. N. **C.06**

OGGETTO: – Elaborati Tecnici estimativi

▣ **Cronoprogramma**

IL R.U.P.

Ing. Giovanna Scianti)

PROGETTISTI

Ordine degli Ingegneri DOTT. ING. MARCO ANFUSO N. 604 Ragusa

(Ing. Marco Anfuso)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DOTT. ING. ANTONINO RUSSO 821 RAGUSA

(Ing. Antonino Russo)

TIMBRI DI APPROVAZIONE

PROGECO

PROGECO srl VIA MARZI 331,84, 4 - 97100 RAGUSA
tel. +39 0932 622242 - fax +39 0932 621724
CF e P.IVA 00102700885 info@progecosrl.eu/ pro@progecosrl.eu

Collaboratori: *Ing. Giovanni Dimartino – Ing. Giovanni Cassarino*

Rev.n.00 Pr.: 5 File:

Data: Giugno 2017
